
WBS Proyek Website Tani Casual

Proyek website company profile dan katalog Tani Casual dipecah menjadi 7 fase dan 29 paket kerja selama 15 minggu, dari Definisi Proyek (Minggu 1) sampai BAST (Minggu 15).

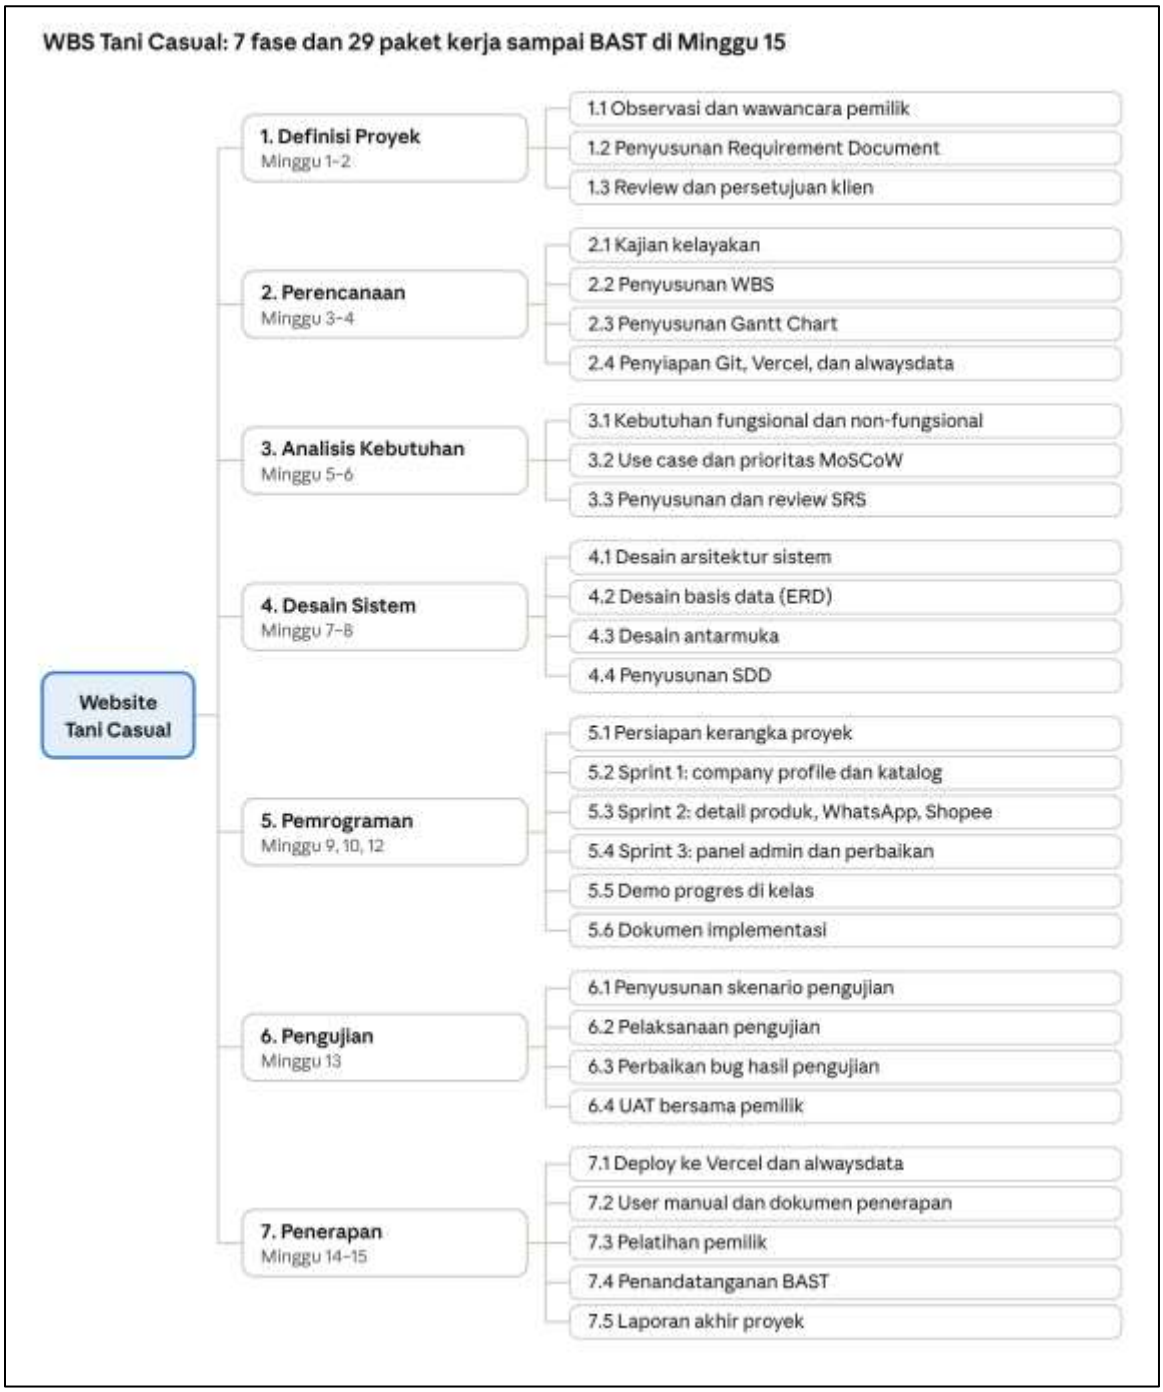

WBS Tani Casual 7 fase, 29 paket kerja

Setiap fase mengikuti tabel jadwal di Requirement Document; pemrograman dibagi tiga sprint.

Rincian paket kerja

Baris tebal adalah fase penanggung jawab mengikuti enam peran di Requirement Document.

Kode	Paket kerja	Penanggung jawab	Minggu	Luaran
1	**Definisi Proyek**		**1–2**	**Requirement Document + persetujuan klien**
1.1	Observasi dan wawancara pemilik	System Analyst	1	Catatan observasi dan wawancara
1.2	Penyusunan Requirement Document	System Analyst	1–2	Requirement Document
1.3	Review dan persetujuan klien	Project Manager	2	RD disetujui pemilik
2	**Perencanaan**		**3–4**	**Kelayakan, WBS, Gantt Chart**
2.1	Kajian kelayakan	System Analyst	3	Kajian kelayakan
2.2	Penyusunan WBS	Project Manager	3	WBS
2.3	Penyusunan Gantt Chart	Project Manager	4	Gantt Chart
2.4	Penyiapan Git, Vercel, dan alwaysdata	Programmer	4	Repositori dan akun hosting siap
3	**Analisis Kebutuhan**		**5–6**	**SRS**
3.1	Rincian kebutuhan	System Analyst	5	Daftar kebutuhan

Kode	Paket kerja	Penanggung jawab	Minggu	Luaran
	fungsional dan non-fungsional			
3.2	Use case dan prioritas MoSCoW	System Analyst	5–6	Use case dan prioritas kebutuhan
3.3	Penyusunan dan review SRS	System Analyst	6	SRS
4	**Desain Sistem**		**7–8**	**SDD**
4.1	Desain arsitektur sistem	System Designer	7	Arsitektur Laravel + Inertia.js + Vue, Vercel, dan alwaysdata
4.2	Desain basis data	System Designer	7	ERD dan struktur tabel MySQL
4.3	Desain antarmuka	System Designer	8	Wireframe dan mockup
4.4	Penyusunan SDD	System Designer	8	SDD
5	**Pemrograman**		**9, 10, 12**	**Website + dokumen implementasi**
5.1	Persiapan kerangka proyek	Programmer	9	Proyek Laravel + Inertia.js + Vue terhubung ke MySQL
5.2	Sprint 1: company profile dan katalog produk	Programmer	9	F-01 dan daftar produk F-02 (pencarian, filter, pengurutan)
5.3	Sprint 2: detail	Programmer	10	Detail produk, F-

Kode	Paket kerja	Penanggung jawab	Minggu	Luaran
	produk, WhatsApp, Shopee, kontak			03, F-04, halaman kontak
5.4	Sprint 3: panel admin dan perbaikan	Programmer	12	F-05, F-06, perbaikan dari demo sprint
5.5	Demo progres di kelas	Project Manager	9, 10, 12	Demo di akhir setiap sprint
5.6	Dokumen implementasi	Technical Writer	12	Dokumen implementasi
6	**Pengujian**		**13**	**Skenario pengujian & UAT**
6.1	Penyusunan skenario pengujian	Tester	13	Skenario Black Box dan UAT
6.2	Pelaksanaan pengujian	Tester	13	Hasil uji fungsi, lintas browser, HP dan laptop
6.3	Perbaikan bug hasil pengujian	Programmer	13	Bug terselesaikan
6.4	UAT bersama pemilik	Tester	13	Skenario UAT berstatus "Diterima"
7	**Penerapan**		**14–15**	**Dokumen penerapan, user manual, BAST, laporan**
7.1	Deploy ke Vercel dan alwaysdata	Programmer	14	Website dapat diakses online

Kode	Paket kerja	Penanggung jawab	Minggu	Luaran
7.2	User manual dan dokumen penerapan	Technical Writer	14	User manual admin dan dokumen penerapan
7.3	Pelatihan pemilik	Project Manager	14–15	Pemilik siap mengelola panel admin
7.4	Penandatanganan BAST	Project Manager	15	BAST
7.5	Laporan akhir proyek	Technical Writer	15	Laporan akhir
